

ZMĚNOVÝ LIST Č. 7

Stavba: „Manětín – ČOV a kanalizace“

Číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace (EIS): CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006946

Objednatel: Město Manětín, Manětín 89, 331 62 Manětín, IČ: 00258091

TDI: AP INVESTING, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno. IČ: 60712121

Autorský dozor: VP Plzeň a.s., Pražská 14, 303 02 Plzeň, IČ: 62623508

Zhotovitel: Společnost Manětín – ČOV a kanalizace, PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 1, IČ: 43005560

Pojmenování změny: Přeložka dešťové kanalizace na stoce B2-2

Změna se týká těchto SO a PS: SO 09.4b (Stoka B2-2)

Změnu navrhuje: zhotovitel

Odůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je přeložka stávající dešťové kanalizace na stoce B2-2. Po vytýčení stávajících sítí (zejména stávajícího vodovodu PVC d110) bylo zjištěno, že trasa vodovodu koliduje s trasou nově navržené splaškové kanalizace stoky B2-2 v úseku mezi šachtami od ŠB2-2-1 do ŠB2-2-4. Z výše uvedeného vyplývá, že musela být v tomto úseku posunuta trasa nově navržené splaškové kanalizace. Po provedení 2ks kopaných sond byla určena předpokládaná trasa stávající dešťové kanalizace a tato trasa kolidovala s nově zvolenou trasou splaškové kanalizace, aby bylo možné v souladu s normou o prostorovém uspořádání sítí (ČSN 73 6005) uložit splaškovou kanalizaci do poměrně úzké místní komunikace, bylo nutné v daném úseku provést přeložku stávající dešťové kanalizace. Na trase stávající dešťové kanalizace bylo nalezeno několik odboček pro nemovitosti, které byly přepojeny do přeložené dešťové kanalizace. Vzhledem k časovým a finančním úsporám byl zvolen materiál pro přeložku PVC, DN250, ačkoli stávající dešťová kanalizace byla z kameninových trub staršího typu (bez glazury). Místa napojení na začátku a na konci překládaného úseku byla propojena za pomoci spojovacích manžet.

Změna je v souladu s ust. §222, odst. 4 zák.č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO

Časový dopad na stavbu: NE

Výpočet nákladů na změnu:

165.335,79 Kč (bez DPH)

1/ Návrh změny vypracoval:

Jméno: Zdeněk Matys

Datum: 24. 6. 2020

Podpis

PORR a.s. -90-
Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Smetana
IČO: 43005560

2/ Stanovisko autorského dozoru:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Jan Vraný

Datum: 24. 6. 2020

Podpis

3/ Stanovisko TDI:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: Ing. Petr Novák

Datum: 24. 6. 2020

Podpis

4/ Rozhodnutí objednatele o návrhu změny:

Odsouhlasuji

Zamítám

Jméno: Mgr. Josef Gilbert Matuška


Datum: 25 -06- 2020

Podpis

MĚSTO MANĚTÍN
331 62 MANĚTÍN

okr. Plzeň - sever

Přílohy: 1) Situační schéma změny
4) Soupis a ocenění prací týkajících se změny
5) Fotodokumentace

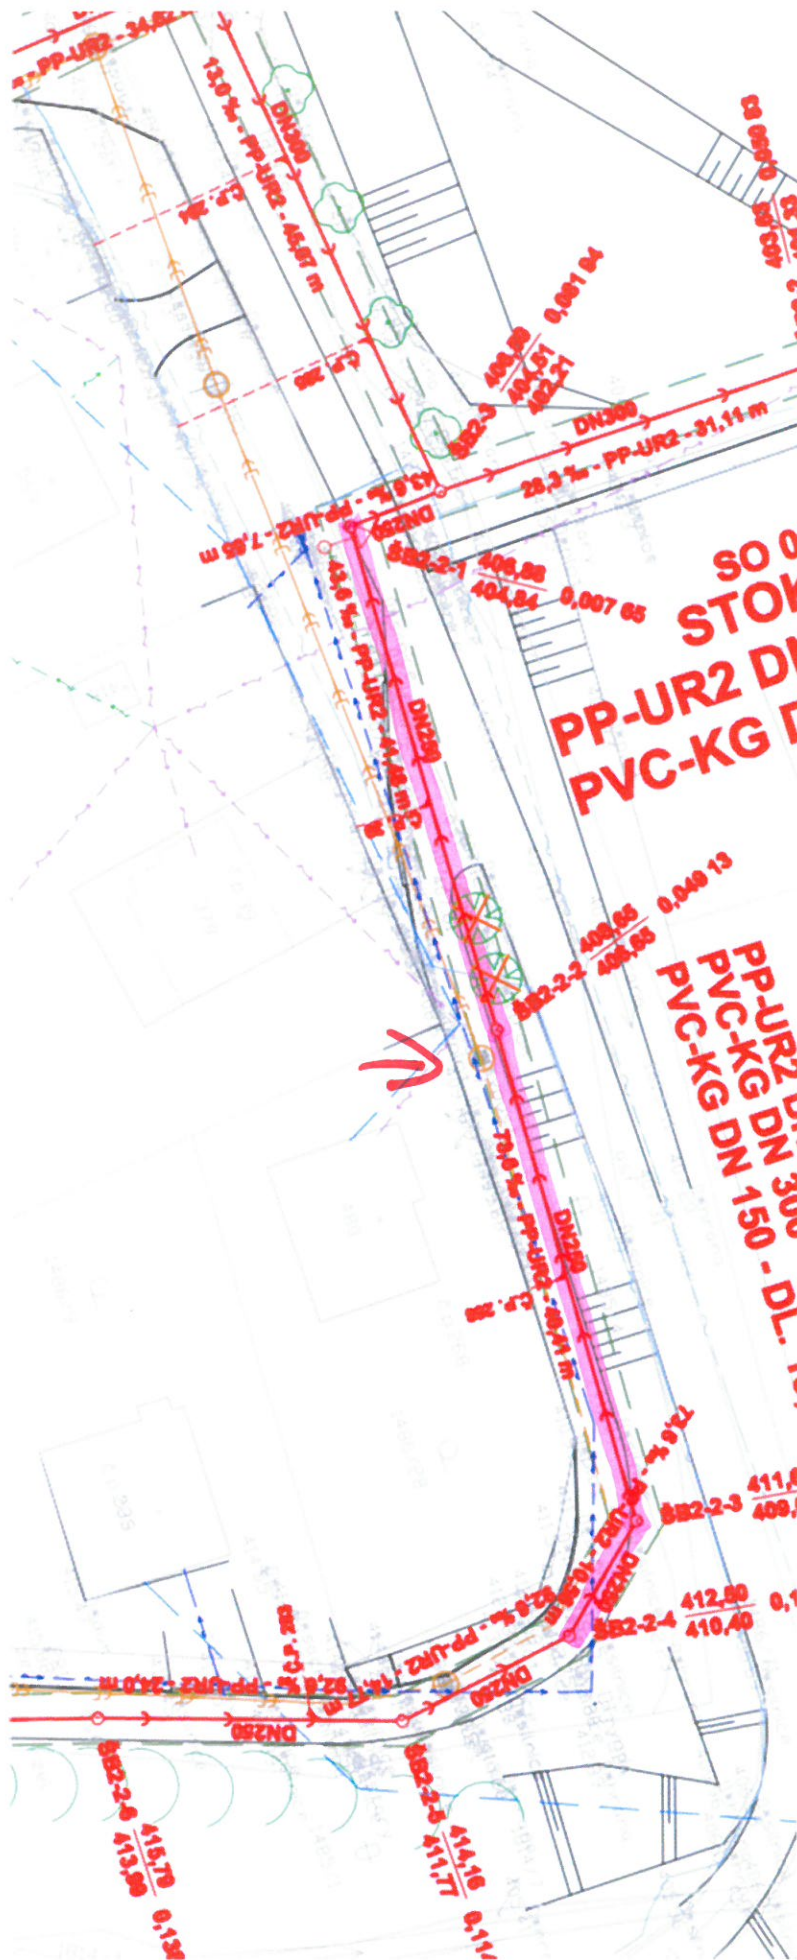

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dle Sd	Více práce	Méně práce	Dle zmínového listu	Dle Sd	Více práce	Méně práce	Rozdíl	Dle zmínového listu
D 5														
Kominikace pozemní														
45	K	56485111	Podklad ze stěrky do 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	155,50	169,400	37,500		206,900	228 620,82	48 570,00	0,00	48 570,00	277 190,82
46	K	56486111	Podklad ze stěrky do 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	185,60	169,400	37,500		206,900	26 341,70	5 831,25		5 831,25	32 172,95
47	K	56514611	Ařádnový beton vrtava podkladní ACP 16 (obložení kamennou střechou) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	409,20	169,400	37,500		206,900	31 440,64	6 960,00		6 960,00	38 400,64
48	K	57713411R	Ařádnový beton vrtava ochranná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 1, po zhutnění tl. 40 mm, vč. spojovacího postřiku	m2	334,90	300,000	37,500		337,500	69 318,48	15 345,00		15 345,00	84 663,48
49	K	91912121	Těsnění spár arifitovou emalí	m	105,00	10,000	75,000		85,000	100 470,00	12 558,75		12 558,75	113 028,75
D 8														
Trubní vedení														
56	K	871310310	Montáž kanalizačního potrubí z plastu z PVC hladkého průstředního SN 8 DN 150	m	142,50	19,800	2,500		22,300	557 429,19	64 363,50	0,00	64 363,50	621 792,69
57	M	286112640	trubka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/4,7/SM S/8	m	145,40	20,100	2,538		22,638	2 821,50	356,25		356,25	3 177,75
57a	K	87137-3121.R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, do DN 300	m	38,40	0,000	87,300		87,300	2 922,54	369,03		369,03	3 291,57
57b	M	2861126A.R	Trubka kanalizační KGEA SN 8 PVC 250/7,3/5000	kus	2 850,00	0,000	18,000		18,000		3 352,32		3 352,32	3 352,32
57c	K	87726-3121.R00	Montáž tvorovek sbočů plast gum. kroužek DN 250	kus	140,00	0,000	2,000		2,000		51 300,00		51 300,00	51 300,00
57d	M	28651712.A.R	Odbočka kanalizační KGEA 250/160/45 PVC	kus	876,00	0,000	2,000		2,000		280,00		280,00	280,00
57e	K	87726-3123.R00	Montáž tvorovek jednoos. plast gum. kroužek DN 250	kus	88,40	0,000	7,000		7,000		1 752,00		1 752,00	1 752,00
57f	M	28651670.A.R	Koleno kanalizační KGB 250/15 PVC	kus	525,00	0,000	2,000		2,000		618,80		618,80	618,80
57g	M	28651671.A.R	Koleno kanalizační KGB 320/30 PVC	kus	575,00	0,000	3,000		3,000		1 050,00		1 050,00	1 050,00
57h	M	28651858.A.R	Přechod kamenná PVC kanalizační KGU 160 PVC	kus	413,00	0,000	2,000		2,000		1 725,00		1 725,00	1 725,00
39	K	877353122R	Montáž přírůstek na potrubí z kanalizačních trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 250	kus	118,70	0,000	1,000		1,000		826,00		826,00	826,00
57j	M	28651814.A.R	Přísuvka kanalizační KGU 250 PVC	kus	535,00	0,000	1,000		1,000		118,70		118,70	118,70
57k	K	87737-3123.R00	Montáž tvorovek jednoos. plast gum. kroužek DN 300	kus	99,20	0,000	2,000		2,000		535,00		535,00	535,00
57l	M	28651695.A.E	Redukce kanalizační KGB 315/250 PVC	kus	941,00	0,000	2,000		2,000		198,40		198,40	198,40
D 997														
Přesun sítě														
88	K	919735112	Řezání stávajícího živého křtu nebo podkladu tloučky přes 50 do 100 mm	m	77,10	451,000	75,000		526,000	55 539,02	9 934,32	0,00	9 934,32	65 473,34
89	K	997221551	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypaných materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	55,80	138,970	27,790		166,760	34 772,10	5 782,50		5 782,50	40 554,60
90	K	997221559	Vodovodná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další 1 m	t	1,40	3 335,280	666,960		4 002,240	7 754,53	1 550,68		1 550,68	9 305,21
91	K	997221845	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů	t	60,00	44,150	6,790		50,940	4 669,39	933,74		933,74	5 603,13
92	K	997221855	Příplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z kamenná	t	60,00	94,900	21,000		115,900	2 649,00	407,40		407,40	3 056,40
D 998														
Přesun hmot														
93	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení tloučkou z trub z plastových hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v ozeveném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	274,30	63,520	0,055		63,575	17 423,54	15,09	0,00	15,09	17 438,63

doplňující informace:

pol. č. 39 označena položka není součástí SO 09-4 b - Skloka B2.2, tato položka byla použita z SO 10.3 - Odešlanci komora OK - C1

takto označené položky nejsou součástí rozpočtu stavby, do kterých byly doplněny z cenové soustavy RTS Brno v cenové úrovni 2017

NOVÉ POLOŽKY

Postup dle Smlouvy o dílo - čl. V., odst. 24, bod 24.2

Vzorec pro kalkulaci nových položek:

Cena nových prací, dodávek a služeb = k * C_n

C_n = cena nových prací, dodávek a služeb dle ceníku RTS Brno v cenové úrovni 2017

$$k = \frac{\text{cena zhotovitele dle této smlouvy ke dni podpisu smlouvy}}{\text{předpokládaná hodnota zakázky}} \leq 1$$

$$k = \frac{104 498 553,80}{96 405 501,00} = 1,08 > 1 = 1 \Rightarrow \text{budou použity ceny z ceníku RTS Brno (2017)}$$





