

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Evidovaná u objednatele pod č. SML693/2016/Inv

Evidovaná u zhotovitele pod. č. 612/2016

uzavřená dle § 2586 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

I. Smluvní strany

objednatel: **Město Vratimov**
sídlo: Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
zastoupeno: JUDr. Dagmar Hrudovou, starostkou města Vratimov
IČO: 00297372
DIČ: CZ00297372
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: Ing. Alena Kašparová, Miloslav Blažek
bankovní spojení: č. ú. 4200064226/6800, Sberbank CZ a.s.
tel.: 595 705 931, 595 705 930
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **BYSTROŇ Group a. s.**
sídlo: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava
zastoupena: Michal Bystroň, člen představenstva a. s.
IČO: 27800466
DIČ: CZ27800466
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: Pavel Volek, stavbyvedoucí, Ing. Miroslava Jindrová
bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 107-1615600277/0100
tel.: 775 026 051, 739 521 237
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“ se dohodli na následujícím dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek“) ke smlouvě uzavřené dne 10.08.2016 mezi smluvními stranami (dále také jako „smlouva“):

Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. IV odst 1 se mění a doplňuje i s ohledem na vícepráce, které je nutno provést nad rámec schválené projektové dokumentace, a které spočívají v provedení prací dle změnových listů č. 1 – 5 takto:

Odstavec 1 písm. a) se mění a doplňuje na toto nové znění:

Termín 130 kalendářních dnů od převzetí staveniště se upřesňuje a mění takto:

Od převzetí staveniště do 28.02.2017 budou prováděny ty stavební práce, které nelze provést za plného provozu školy. Jedná se zejména o provedení nástavby, střešních konstrukcí, úpravy těch částí stavby, které jsou prováděny uvnitř budovy, tzn. takové stavební práce, které budou

vyžadovat kolaudační souhlas dle zákona č. 183/2006 Sb., a všechny, které by bránily řádnému a bezpečnému užívání stavby pro výuku žáků základní školy.

Zhotovitel v termínu do 27.12.2016 provede veškeré stavební úpravy, aby mohla být ode dne 01.02.2017 zahájena výuka žáků ve zkolaudovaných prostorách 1. PP až 3.NP včetně podkroví s výjimkou části 1. PP, a to v části spojovací chodby za provedenými protipožárními dveřmi PO 08. směrem k tělocvičně včetně tělocvičny (místnost č. 019a, 014 a 033) a navazujících prostor.

V termínu do 10.01.2017 provede úklid vnitřních prostor školy v této dokončené a předané části stavby včetně výmalby těch prostor, které byly dotčeny stavbou nebo kde došlo k zatečení, či jinému poškození v průběhu realizace stavby, odstranění poškození způsobených při realizaci stavby v těch prostorách školy, kde bude zahájena výuka žáků a umytí vnitřních i venkovních stran oken v této části stavby.

Prostory v 1. PP budou počínaje dnem 01.02.2017 do 28.02.2017 využívány pro výuku a provoz školy jen částečně a to tak, že užívání bude omezeno v tomto podzemním podlaží od protipožárních dveří PO 08 v celé spojovací chodbě (část 014 a 019) mezi hlavní budovou a tělocvičnou, včetně tělocvičny a všech místností nacházejících se v této části budovy.

V termínu do 10.01.2017 předá zhotovitel objednateli veškeré doklady potřebné ke kolaudaci té části stavby, která bude počínaje dnem 01.02.2017 využívána pro výuku žáků dle tohoto dodatku.

Část stavby v 1. PP v části od protipožárních dveří PO 08 v celé spojovací chodbě (část 014 a 019) mezi hlavní budovou a tělocvičnou včetně tělocvičny a všech místností nacházejících se v této části budovy zhotovitel dokončí v termínu do 28.02.2017, v tomto termínu předá objednateli veškeré doklady potřebné ke kolaudaci této části stavby a provede úklid vnitřních prostor školy v této části stavby včetně výmalby těch prostor, které byly dotčeny stavbou nebo kde došlo k zatečení, či jinému poškození v průběhu realizace stavby a umytí vnitřních i venkovních stran oken v této části stavby.

Odst. 1 písm. b) se mění takto:

Po uplynutí 130 kalendářních dnů od převzetí staveniště budou prováděny jen stavební práce uvedené v odst. 1 písm. a) a dále ty stavební práce, které nebrání provozu školy. Zhotovitel bere na vědomí, že bude provádět tuto část díla tak, aby v co možná nejmenší možné míře omezoval výuku žáků a byla plně zajištěna jejich bezpečnost v souvislosti s realizací díla, jedná se zejména o zateplení fasády objektu základní školy, práce ve spojovací chodbě a přilehlých místnostech mezi protipožárními dveřmi PO8 a tělocvičnou a další práce prováděné v termínu do 14.07.2017. Do téhož termínu budou předány veškeré zbývající doklady, certifikáty případně zkoušky a revize týkající se těchto stavebních prací.

Odst. 1 písm. c) se ruší. Ostatní ujednání tohoto článku odst. 2 a odst. 3 se nemění.

Čl. V. Cena díla, odst. 1. se doplňuje o odst. 1.1 tohoto znění:

Cena díla sjednaná v čl. V. odst. 1 se zvyšuje nebo snižuje o ceny prací, dodávek a služeb dle změnových listů odsouhlasených zhotovitelem a objednatelem formou dodatku k této smlouvě.

Číslo dodatku	Změnový list	Zvýšení (+), Snížení (-) (bez DPH) Kč
Dodatek č. 1	ZL č. 1	+235.540,98
Dodatek č. 1	ZL č. 2	+121.362,00
Dodatek č. 1	ZL č. 3	-1.092,50
Dodatek č. 1	ZL č. 4	+12.051,94
Dodatek č. 1	ZL č. 5	-33.536,37
Celkem		+334.326,05

Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH 23.832.246,19 Kč

DPH ve výši 21% 5.004.771,69 Kč

Cena včetně DPH 28.837.017,88 Kč

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1 až 5
5. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (Obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Dodatek č. 1 Smlouvy byl schválen usnesením Rady města Vratimova č. 43.25 ze dne 8.11.2016

Ve Vratimově dne 10. 11. 2016

V Ostravě dne 11. 11. 2016

MĚSTO VRATIMOV

Frydecká 853, 739 32 Vratimov
okr. Ostrava-město
IČ 00297372 DIČ CZ00297372

JUDr. Dagmar Hrudová
Starostka

Bystron
GROUP

BYSTRON Group a.s.
Chopinova 576/1
Ostrava-Přivoz
Tel.: +420 596 135 305
GSM: +420 777 813 873
IČ: 27800461
DIČ: CZ27800466

Michal Bystron
člen představenstva a. s.

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SŮ/PS):

D.1.1 Arch.stav. Řešení

Číslo SŮ/PS /

/ číslo změny SŮ/PS:

D.1.1

Číslo změny stavby:

01

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.8.2016 č.smlouvy SML693/2016/Inv, evid.u zhotovitele pod. č. 612/2016

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Zhotovitel: BYSTRON group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

TDS: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Radim Kytnar - vedoucí skupiny TDS

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Počet paré:

Vyhotovil:

1 x

BYSTRON Group a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

1 - V průběhu bouracích prací stávající dlažby v 1PP, 1NP, 2NP a 3NP bylo zjištěno, že po odstranění terasové dlažby je podkladní beton je oddělený od stropní konstrukce. Tuto skutečnost nebylo možno v době zpracování PD zjistit ani předpokládat. Na základě vyjádření GP, ze dne 22. 9.2016 je nutné stávající nesoudržnou vrstvu vybourat a v celém rozsahu a s jejím nahrazením anhydritovým litým potěrem, pevnost C25. Z důvodů technologické přestávky (vyzrání betonu - 4 týdny) nelze provádět navazující práce v ploše daných podlah, TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA DÍLČÍ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.



TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA A MÁ VLIV NA DÍLČÍ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

prodloužení stavby o 4 týdny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-155 369,40	-0,66%	390 910,38	1,66%	235 540,98

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	Šárka Pumprlová	datum	4. 11. 2016	podpis	
TDS:	Jméno	Ing.Radim Kytnar	datum	4. 11. 2016	podpis	
Zhotovitel:	Jméno	Roman Suchanec	datum	4. 11. 2016	podpis	
Objednatel:	Jméno	Ing.Alena Kašparová	datum	4. 11. 2016	podpis	
Objednatel:	Jméno	Judr. Dagmar Hrudová	datum	4. 11. 2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedinou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

6

D	HSV	Práce a dodávky HSV								
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování xýplů								
184	K	631311113	Mazanina tl. do 90 mm z betonu prostého tř. C 20/25 F PP=3,44; T NP=71,35; Z NP=16,63; 3 NP=1,92 součet = 76	m3	8,16	2 280,00	0,00	349 048,17	14 154,70	363 202,87
								18 604,80		18 604,80
129	K	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl. do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-137,96	102,60		-14 154,70	14 154,70	
130	K	632461213	Separační vrstva z PE fólie	m2	756,31	20,90		15 806,88		15 806,88
R	R	R	Potěr armidovaný samonivelnací tl. do 45 mm C 25 včetně dilatačních lšt. obvodových dilatačních pásků a přípravy podkladu 429,6+260+137,96 součet = 827,56	m2	-687,56	-178,20		-328 791,19		328 791,19
D 9		Ostatní konstrukce a práce bourání								
170	K	965041441	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazaniny škvárcovými tl. přes 100 mm tl. přes 4 m2	m3	107,4	855,00	0,00	9 182,70	0,00	9 182,70
D 997		Přesun sutě								
194	K	997013313	Montáž a demontáž úvozů sdíl. v do 30 m	m	18,00	380,00		14 634,56	0,00	14 634,56
195	K	997013323	Příplatek k úvozu sdíl. v do 30 m za první a 200 den pořízení	m	540,00	5,70		6 840,00		6 840,00
196	K	997013807	Odvážení na skládku s vibrováním liniové nebo meziklasové do 1 km se skladním	t	17,12	57,00		3 078,00		3 078,00
								975,84		975,84

197	K	997013509	Příplatek k odvozu sutě a vysočených úmet na skládku ZKO1 km přes 1 km	1	342,40	3,80	1 301,12	1 301,12
198	K	997013531	Poplatek za ložení stavebního materiálu odpadu na skládce (skládkové)	1	17,12	42,50	2 439,60	2 439,60
D 998 Přesun hmot								
199	K	99801003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	1	45,00	85,50	3 890,25	3 890,25
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 771 Podlahy z dlaždic								
507	K	771900111	Vyrovnání podkladu samonivelační směsí tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	-587,56	152,00	-141 214,70	0,00
508	K	771900191	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační směsí tl 15 Mpa ZKO 1 mm tloušťky	m2	6 194,73	4,75	-104 509,12	-29 410,72
509	K	99871103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objemech v do 24 m	1	-17,86	427,50	-7 294,86	-7 294,86

	ACP	VCP
	-155 369,40	390 910,38

Handwritten signature and initials

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D.1.4.B. Vytápění	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: D.1.4.B	Číslo změny stavby: 02
---	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.8.2016 č.smlouvy SML693/2016/Inv, evid.u zhotovitele pod. č. 612/2016

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

TDS: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Radim Kytmar - vedoucí skupiny TDS

Přílohy:	Počet paré:	Vyhotovil:
1) Položkový rozpočet	1 x	BYSTROŇ Group a.s.
2) Fotodokumentace	1 x	BYSTROŇ Group a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

1 – V průběhu bouracích prací stropní konstrukce 1 PP pro výtahovou šachtu, byly obnaženy stávající rozvody topení objektu, s kterými PD nepočítala (nebyly známy trasy vedení instalací ve stropě 1PP). K realizaci přeložky je nutno odbourat a následně uvést do původního stavu podlahové konstrukce, což vyvolá zdržení dalších prací v rozsahu 4 týdny. Změna má vliv na dílčí termín, toto má návaznost na ZL-1. TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA DÍLČÍ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA DÍLČÍ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

prodloužení stavby o 4 týdny

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	121 362,00	0,52%	121 362,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	Šárka Pumpřiová	datum	4. 11. 2016	podpis	
TDS:	Jméno	Ing.Radim Kytmar	datum	4. 11. 2016	podpis	
Zhotovitel:	Jméno	Roman Suchanec	datum	4. 11. 2016	podpis	
Objednatel:	Jméno	Ing.Alena Kašparová	datum	4. 11. 2016	podpis	
Objednatel:	Jméno	Judr. Dagmar Hrudová	datum	4. 11. 2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: **3**

Rozpočet k ZL 02

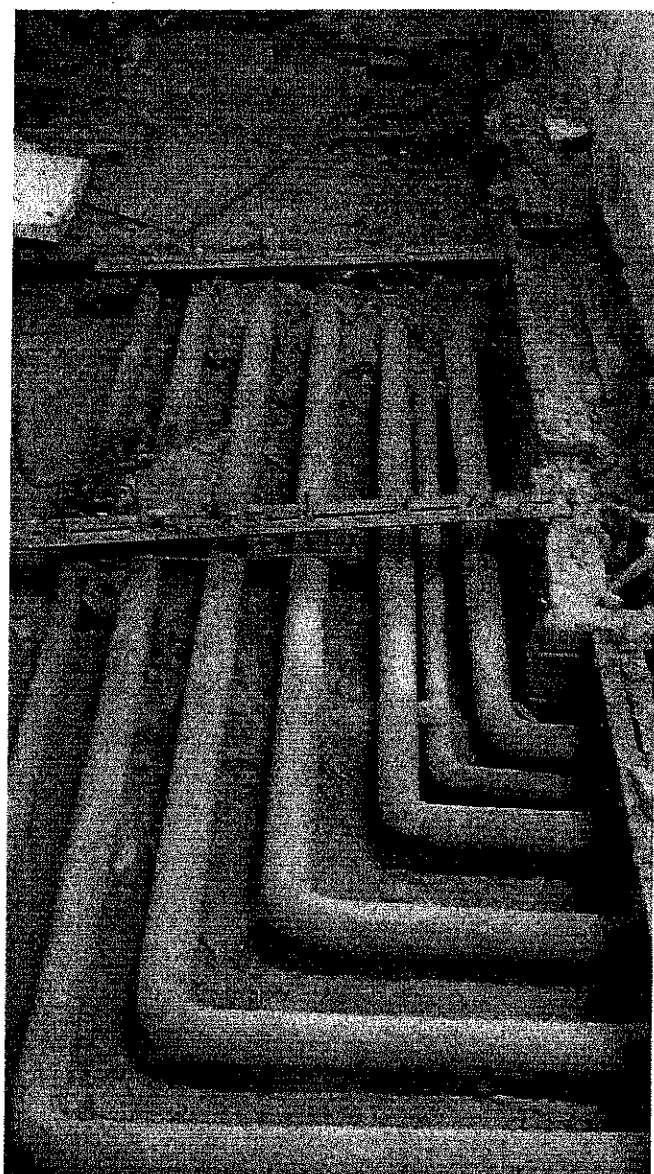
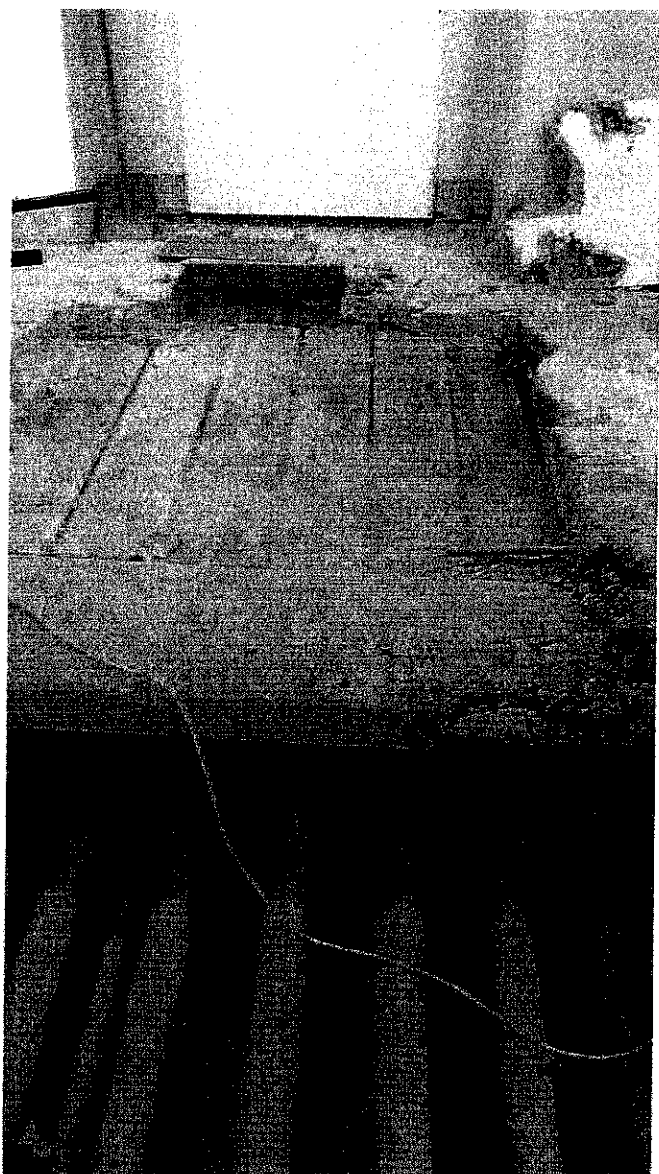
Stavba :	
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	713-ROZ-01	Mtž izolace potrubí ocel DN40 až DN 65	m	48,00	34,00	1 632,00
2	713-ROZ-03	Návrh. izolace DN40 - DN65 Rockwool L=0,038, tl. 50	m	48,00	75,00	3 600,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				5 232,00
Díl: 734		Rozvod potrubí				
3	734-ROZ-02	Ocelové potrubí DN50	m	48,00	735,00	35 280,00
4	734-ROZ-08	Tlaková zkouška potrubí	m	650,00	15,00	9 750,00
	Celkem za	734 Rozvod potrubí				45 030,00
Díl: 783		Nátěry				
5	783-ROZ-01	Nátěr syntetický potrubí do DN 65 mm Z + 2x	m	48,00	55,00	2 640,00
	Celkem za	783 Nátěry				2 640,00
Díl: 999		Ostatní				
6	999-ROZ-01	Demontáže stáv. potrubí, úpravy	hod	24,00	220,00	5 280,00
7	999-ROZ-02	Napuštění, odvzdušnění systémů	hod	24,00	220,00	5 280,00
8	999-ROZ-03	Hydraulické vyregulování otopného systému	hod	8,00	220,00	1 760,00
9	999-ROZ-04	Topná zkouška systémů	hod	48,00	220,00	10 560,00
10	999-ROZ-05	Stavební přípomoce	kpl	1,00	41 180,00	41 180,00
		bourání betonových konstrukcí, přesun suti, demontáž stropních panelů, podezdívka panelů, zpětné osazení stropních panelů, šalování stropní desky, betonáž stropní desky				
11	998 71-3202.R00	Přesun hmot pro	kpl	1,00	4 400,00	4 400,00
	Celkem za	999 Ostatní				68 460,00

Celkem za dílo bez DPH

121 362,00

FOTODOKUMENTACE K ZL 02



1.
2/10

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D.1.1 Arch.stav. Řešení	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: D.1.1	Číslo změny stavby: 03
---	---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.8.2016 č.smlouvy SML693/2016/Inv, evid.u zhotovitele pod. č. 612/2016

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Zhotovitel: BYSTRON group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

TDS: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Radim Kytnar - vedoucí skupiny TDS

Přílohy: 1) Položkový rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Počet paré:</td> <td style="width: 70%;">Vyhotovl:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td style="text-align: center;">BYSTRON Group a.s.</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovl:	1 x	BYSTRON Group a.s.
Počet paré:	Vyhotovl:				
1 x	BYSTRON Group a.s.				

Popis a zdůvodnění změny:

1- Dle skutečného zaměření stávající okenních otvorů v podlaží 3 NP bylo zjištěno, že nové navržené okno pozice P/10 je širší než stávající okno pod pozici P/10. Na základě požadavku GP, bude pozice P/10 vyrobena ve stejném rozměru jako pozice P/11.
TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.



TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-14 487,50	-0,06%	13 395,00	0,06%	-1 092,50

Vyjádření - souhlas se změnou:


Projektant (autorský dozor):	Jméno	Šárka Pumprlová	datum	4. 11. 2016	podpis	
TDS:	Jméno	Ing. Radim Kytnar	datum	4. 11. 2016	podpis	
Zhotovitel:	Jméno	Roman Suchanec	datum	4. 11. 2016	podpis	
Objednatel:	Jméno	Ing. Alena Kašparová	datum	4. 11. 2016	podpis	
Objednatel:	Jméno	Judr. Dagmar Hrudová	datum	4. 11. 2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Není součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

4



K

List obsahuje:

1) krycí list soupisu

2) Rekapitulace

3) Soupis prací

ROZPOČET K ZL 03

Stavba:

Nástavba a stavební úpravy ZŠ Datýňská

Místo:

Město Vratimov, Frýdecká 853/57, Vratimov
BYSTRON Group a.s.

Místo:

Projektant: Arpik Ostrava s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

MCP -1 092,50 VCP Cena dle URS 13 395,00

D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	0,00
429	K	766V38	P10 Okno z plastových profilů 1500x2350 mm dle specifikace D-M	ks	-1,00	14 487,50	-14 487,50
P10		Okno z plastových profilů 1500x2350 mm dle specifikace D-M					
VZ		TZP, VÝMR. č. 68 "1		1,00		0,00	
VZ		Součet		1,00		0,00	
430	K	766V39	P11 Okno z plastových profilů 1350x2150 mm dle specifikace D-M	ks	1,00	13 395,00	13 395,00
P11		Okno z plastových profilů 1350x2150 mm dle specifikace D-M					
VZ		TZP, VÝMR. č. 63 "1		1,00		0,00	
VZ		Součet		1,00		0,00	

MCP	VCP
-14 487,50	13 395,00

10

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: "Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov" Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D.1.4.A ZTI	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: D.1.4.A	Číslo změny stavby: 04
---	---	---

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.8.2016 č.smlouvy SML693/2016/Inv, evid.u zhotovitele pod. č. 612/2016

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Zhotovitel: BYSTRON group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

TDS: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Radim Kytnar - vedoucí skupiny TDS

Přílohy: 1) Položkový rozpočet 2) Výkresová dokumentace	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Počet paré:</td> <td style="text-align: left;">Vyhotovil:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">BYSTRON Group a.s.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1 x</td> <td style="text-align: left;">ARPIK Ostrava s.r.o.</td> </tr> </table>	Počet paré:	Vyhotovil:	1 x	BYSTRON Group a.s.	1 x	ARPIK Ostrava s.r.o.
Počet paré:	Vyhotovil:						
1 x	BYSTRON Group a.s.						
1 x	ARPIK Ostrava s.r.o.						

Popis a zdůvodnění změny:

1 - V době projekčních prací se neuvažovalo s využitím třídy ve 4.NP jako učebny chemie, neboť byla jiná koncepce vyučovacích hodin. Využití pro učebnu chemie (laboratoř) bylo řešeno následným projektem. Pro eliminaci budoucího zásahu do hotových konstrukcí byl z důvodu hospodárnosti vznesen požadavek ze strany objednatele na realizaci přípojek vody a kanalizace.

TATO ZMĚNA MÁ

DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ NA KONEČNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.



TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA TERMÍN KONEČNÝ DOKONČENÍ DÍLA

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	12 051,94	0,05%	12 051,94


Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	Šárka Pumprlová	datum	4.7.2016	podpis	
TDS:	Jméno	Ing.Radim Kytnar	datum	4.11.2016	podpis	
Zhotovitel:	Jméno	Roman Suchanec	datum	4.11.2016	podpis	
Objednatel:	Jméno	Ing.Alena Kašparová	datum	4.11.2016	podpis	
Objednatel:	Jméno	Judr. Dagmar Hrudová	datum	4.11.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: **5**



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Nástavba a stavební úpravy ZŠ Datýňská_učebna chemie

Objekt:

D.1.4.A - ZTI-učebna chemie

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14.10.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 051,94

DPH základní
snížená

Základ daně
12 051,94
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 530,91
0,00

Cena s DPH

V CZK

14 582,85

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 150077z2
Stavba: Nástavba a stavební úpravy ZŠ Datyňská_učebna chemie

KSO:
Místo: 14.10.2016
Zadavatel:
Uchazeč:
Výplň údaj
Projektant:
Poznímká:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Vypln údaj
Vypln údaj

Cena bez DPH		12 051,94
DPH	základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		Výše daně 2 530,91 0,00
V CZK		14 582,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 150077Z2

Stavba: Nástavba a stavební úpravy ZŠ Datýňská, učebna chemie

Místo:

Zadavatel: Datum: 14.10.2016
Uchazeč: Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

D.1.4.A ZTI-učebna chemie

12 051,94	14 582,85	
12 051,94	14 582,85	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nástavba a stavební úpravy ZŠ Datýňská_učebna chemie

Objekt:

D.1.4.A - ZTI-učebna chemie

Místo:

Datum: 14.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

12 051,94

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11 964,74

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 718,79

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

5 366,66

M - Práce a dodávky M

3 879,29

36-M - Montáž prov.,měř. a regul. zařízení

87,20

87,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nástavba a stavební úpravy ZŠ Datyňská, učebna chemie

Objekt:

D.1.4.A - ZTI-učebna chemie

Místo:

Datum: 14.10.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číselná soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	------------------

Náklady soupisu celkem

12 051,94

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1	K	721174024	Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	8,000	238,45	1 907,60	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

Pozámka k položce:
Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.

WV 8

8,000

2	K	721174043	Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT d50	m	3,000	203,30	609,90	
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	--

Pozámka k položce:
Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.

WV 3

3,000

3	K	721290123R	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace inertním plynem do DN 300	m	11,000	18,05	198,55	
---	---	------------	---	---	--------	-------	--------	--

WV 11

11,000

4	K	998721101	Přesun hmot tonažní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,006	456,95	2,74	
---	---	-----------	---	---	-------	--------	------	--

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5	K	722174002	Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	15,000	192,85	2 892,75	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

Pozámka k položce:
Včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.

P

5 366,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					15,000			
6	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	10,000	39,90	399,00	
VV					10,000			
7	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	5,000	76,95	384,75	
VV					5,000			
8	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2016 01
VV					4,000			
9	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	15,000	29,45	441,75	
VV					15,000			
10	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	15,000	29,45	441,75	
VV					15,000			
11	K	998772101	Přesun hmot tonážní montáž pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,016	416,10	6,66	
D 725					3 879,29			
12	K	72539201	Montáž ořiváčů zásobníkových závěsných tlakových do 15 litrů	soubor	1,000	274,55	274,55	CS ÚRS 2014 01
P					Pozadí k položce: EOV6			
VV					1,000			
13	M	54132320	ořiváč vody elektrický EO15P 15 l 45x30,2x30,2 cm 2 kW	kus	1,000	3 296,00	3 296,00	CS ÚRS 2016 01
P					Pozadí k položce: EOV6, včetně pojistné soupravy a korvení.			
VV					1,000			
14	K	725862123R	Zápečná uzavěrka od pojistných ventilů	kus	1,000	304,00	304,00	
VV					1,000			
15	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,010	474,05	4,74	CS ÚRS 2014 01

07.28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	36-M		Montáž prov., měř. a regul. zařízení				87,20	
16	K	36142035R	Montáž zásuvky a elektrické přípojky pro odtěvací vody	kpl	1,000	87,20	87,20	

Poznamka k položce:
VČ. potrubní kabeláže, záručky, komplet.

P

W

1

1,000

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

"Nástavba a rekonstrukce ZŠ Vratimov"

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

D.1.1 Arch.stav. Řešení

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

D.1.1

Číslo změny stavby:

05

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 10.8.2016 č.smlouvy SML693/2016/Inv, evid.u zhotovitele pod. č. 612/2016

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Zhotovitel: BYSTROŇ group. a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava

TDS: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Radim Kytnar - vedoucí skupiny TDS

Přílohy:

1) Položkový rozpočet

Počet paré:

Vyhotovil:

1 x

BYSTROŇ Group a.s.

Popis a zdůvodnění změny:

1- V souladu s PD se bude provádět změna bednění střechy a to místo OSB tl. 25 mm za bednění střech impregnovanými hraněnými deskami tl. 25 mm. TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.



TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA.

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-206 267,04	-0,88%	172 730,67	0,74%	-33 536,37

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	Jméno	Šárka Pumprlová	datum	4.11.2016	podpis	
TDS:	Jméno	Ing.Radim Kytnar	datum	4.11.2016	podpis	
Zhotovitel:	Jméno	Roman Suchanec	datum	4.11.2016	podpis	
Objednatel:	Jméno	Ing.Alena Kašparová	datum	4.11.2016	podpis	
Objednatel:	Jméno	Judr. Dagmar Hrudová	datum	4.11.2016	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpisu ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

1

K

List obsahuje: 11 Krovci list soupisu

21 Rekapitulace

3) Soupis prací

ROZPOČET K ZL 05

Stavba:

Nástavba a stavební úpravy ZŠ Datýňská

Místo:

Zadavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, Vratimov
Uchazeč: BYSTRON Group a.s.

Datum:

Projektant: Arpik Ostrava s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-33 536,37

VCP Cena dle URS

D		762	Konstrukce tesařské		MCP		VCP
263	K	762341027	Bezdělní střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	775,44	206 267,04	172 730,67
M	RSV	603111350	Řezivo stavební desky příslušené třídy přes 220 mm délky 2 - 5 m	m3	21,32	107 954,49	6 330,88
			775,44 * 0,025 * 4,1				
K	PSY	762083122	Impregnační barva proti dřevokaznému hmyzu; houbové a plísňové narušení dřeva	m3	21,32	14 889,89	873,00
			775,44 * 0,025 * 4,1				
K	PSV	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	775,44	49 876,30	89,40

MCP	VCP
-206 267,04	-172 730,67
