



MESUP0000KVA



č.j. SVO/3008/2018

Sp. znak: 56.8

Sk. znak: S/5

SML000587

Dodatek č. 1 ke SMLouvě o Dílo č. SVO/1494/2018 ze dne 19.6.2018

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění)

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Město Svoboda nad Úpou**
Se sídlem: náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou
IČ: 002 78 335
DIČ: CZ00278335
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Svoboda nad Úpou
Č. účtu: 1303700359/0800
E-mail: starosta@musvoboda.cz
Jednající: Ing. Jiří Špetla, starosta
Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:
Jiří Rajsner – stavební technik města
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **Tlachač s.r.o.**
Se sídlem: Úpská 301, 542 24 Svoboda nad Úpou
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 34205
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Zdeněk Tlachač
IČ: 035 05 847
DIČ: CZ03505847
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 6215862/0800
E-mail: info@tlachac.cz
Jednající: Zdeněk Tlachač, jednatel
(dále jen Zhotovitel)

II.

Předmět dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo

1) Tímto dodatkem č. 1 k Smlouvě o dílo č. SVO/1494/2018 ze dne 19.6.2018 **se mění**
čl. III odstavec 1 takto:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných objednatelem, **a dále na základě změnových listů č. 1 a č. 2 a Rekapitulace VO dle přílohy č. 3 a činí celkem:**

Předmět zakázky	Cena v Kč bez DPH	Cena DH	Cena v Kč včetně DPH
A) Rekonstrukce chodníků	8 855 462,34	1 859 647,09	10 715 109,43
B) Oprava veřejného osvětlení	7 610 669,11	1 598 240,52	9 208 909,63
Cena za celý předmět zakázky	16 466 131,45	3 457 887,61	19 924 019,06

Tato cena za celý předmět zakázky je nejvýše přípustná.

2) Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo:

- Příloha č. 1- Změnový list č. 1 – složka 3 listů se 3 stranami
- Příloha č. 2- Změnový list č. 2 – složka 7 listů se 7 stranami
- Příloha č. 3 – Rekapitulace a položkový rozpočet veřejného osvětlení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SVO/1494/2018 ze dne 19.6.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.

Ve Svobodě nad Úpou dne 31.10.2018
31.10.2018

Za objednatele:
Ing. Jiří Špetla
starosta města



Ve Svobodě nad Úpou dne



Za zhotovitele:
Zdeněk Tlachač
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:1
Zhotovitel:	Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847	
Změnový list vystavil:	Město Svoboda nad Úpou	
Datum:	6.8.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: změna šíře silničních kamenných obrub z 200mm na 150mm Popis a zdůvodnění změny: z důvodu napojení nových silničních kamenných obrub šíře 200mm na stávající silniční kamenné obruby šíře 150mm se mění šíře nových kamenných obrub z 200mm na 150mm		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-436 008,- Kč	407 592,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-28 416,- Kč	Beze změn	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
starosta	stavbyvedoucí	
Datum:	Datum:	



VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: 90192x 010/17 K.ú. Svoboda nad Úpou, Maršov I, Maršov II - BEZPEČNÁ PĚŠÍ DOPRAVA VE SVOBODĚ NAD ÚPOU

Objekt: 90192x-1 SO.101 REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ - ZMĚNA OBRUBNÍKŮ

Rozpočet: 90192x-1-1 Chodníky

Objednatel: Město Svoboda nad Úpou

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák, s.r.o.

Základní cena: -28 416,00 Kč

Cena celková: -28 416,00 Kč

DPH: -5 967,36 Kč

Cena s daní: -34 383,36 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 296,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: Bc. P. Sýrovátka

Datum zadání: 30.7.2018

Vypracoval nabídku: 

Datum vypracování nabídky: 

9		Ostatní konstrukce a práce				
1	917424	SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM celková délka: 296 = 296,000 [A]	M	296,000	1 377,00	407 592,00
2	917425	SILNIČNÍ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM výkresy C.1.3 a C.1.4 celková délka: 296 = 296,000 [A]	M	-296,000	1 473,00	-436 008,00
9		Ostatní konstrukce a práce				-28 416,00
		Celkem:				-28 416,00




EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program




MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL:2
Zhotovitel:	Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847	
Změnový list vystavil:	Město Svoboda nad Úpou	
Datum:	1.10.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: zachování stávajících žulových obrubníků KS13, úprava travnatého pásu, provedení nového chodníku AB Popis a zdůvodnění změny: stávající žulové obrubníky jsou výškově osazeny dle PD a jsou plnohodnotnou náhradou betonových záhonových obrubníků (v úrovni krytu chodníku). Úprava (snížení) travnatého pásu z důvodu zachování odvodnění chodníku. Nový chodník z asfaltobetonu z důvodu špatného technického stavu části stávající AB plochy.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-38 090,- Kč	66 703,96,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
28 613,96,- Kč	Beze změn	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
starosta	stavbyvedoucí	
Datum: 1. 10. 2018	Datum: 1. 10. 2018	


630/1



šov I, Maršov II
VOBODĚ NAD ÚPOU
CHODNÍKŮ

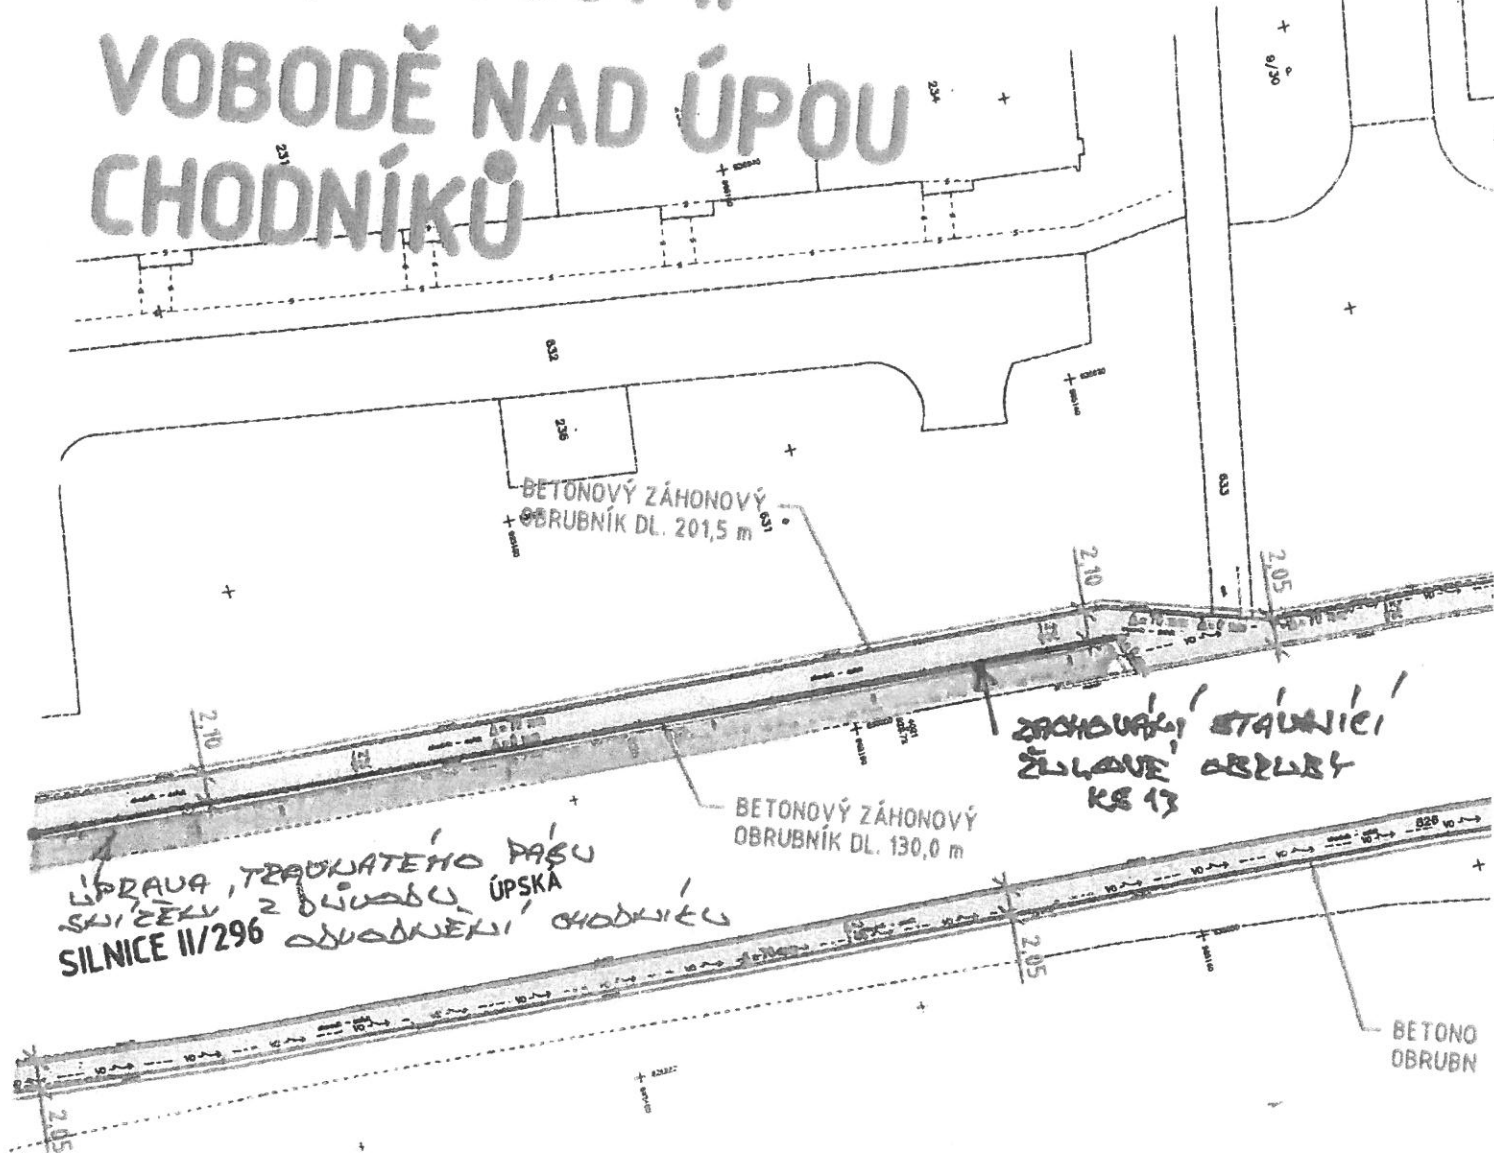

KLAD LISTŮ

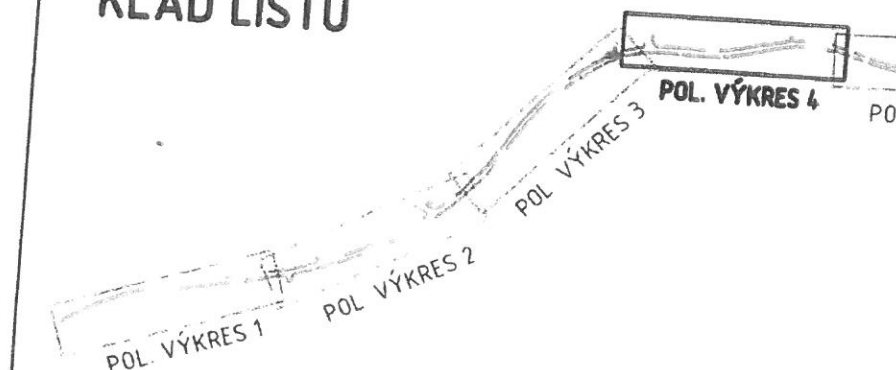

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: 90192x 010/17 K.ú. Svoboda nad Úpou, Maršov I, Maršov II - BEZPEČNÁ PĚŠÍ DOPRAVA VE SVOBODĚ NAD ÚPOU

Objekt: 90192x-2 SO.101 REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ - ZL 2 - doplnění chodníku AB, zachování KS 13

Rozpočet: 90192x-1-1 Chodníky

Objednavatel: Město Svoboda nad Úpou

Zhotovitel dokumentace: DiK Janák, s.r.o.

Základní cena: 28 613,96 Kč

Cena celková: 28 613,96 Kč

DPH: 6 008,93 Kč

Cena s daní: 34 622,89 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: _____

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč



Vypracoval zadání:		Bc. P. Sirovátka		Vypracoval nabídku:	
Datum zadání:		30.7.2018		Datum vypracování nabídky:	
0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	9,728	140,00
		zemina, nestmelený materiál			
		pol. č. 11343::48,64*0,2=9,728 [A]			1 361,92
2	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	-15,600	200,00
		obrubníky, beton, dlažba			
		pol. č. 11354: -130*0,12= -15,600 [A]			-3 120,00
3	014131	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	M3	4,864	480,00
		asfaltový materiál			
		pol. č. 11343:48,64*0,1=4,864 [A]			2 334,72
0	Všeobecné konstrukce a práce				
					576,64
1	Zemní práce				
4	11343	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU	M3	14,592	529,00
		s odvozem na skládku zhotovitele			
		výkres C.1.3			7 719,17
		STÁVAJÍCÍ CHODNÍKY:			
		celková plocha x tloušťka:48,64*0,3=14,592 [A]			
5	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KAM KRAJNÍKŮ	M	-130,000	74,00
		s odvozem na skládku zhotovitele			
		výkres C.1.3			-9 620,00

neprováděné obrubníky: -130= - 130,000

6 18110

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I
výkresy C.1.3 a C.1.4

M2

48,640

13,00

632,32

CHODNÍKY - AB:

celková plocha:48,64=48,640 [A]

7 18130

ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ
výkresy C.1.3 a C.1.4

M2

260,000

6,00

1 560,00

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

celková plocha:260=260,000 [A]

8 18231

ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M
výkresy C.1.3 a C.1.4

M2

260,000

29,60

7 696,00

celková plocha:260=260,000 [A]

9 18241

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
výkresy C.1.3 a C.1.4

M2

260,000

14,20

3 692,00

V PLOCHÁCH OHUMUSOVÁNÍ:

celková plocha:260=260,000 [A]

1 Zemní práce

11 679,49

5 Komunikace

10 56330

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
výkresy C.1.3 a C.1.4

M3

5,837

679,00

3 963,19

CHODNÍKY - AB:

celková plocha x tloušťka:48,64*0,12=5,837 [A]

11 56333

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM
výkresy C.1.3 a C.1.4

M2

48,640

86,00

4 183,04

CHODNÍKY - AB:

celková plocha:48,64=48,640 [A]

12 572211

SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2

M2

48,640

15,00

729,60

0,3 kg/m²
výkresy C.1.3 a C.1.4

CHODNÍKY - AB:
celková plocha: 48,64 = 48,640 [A]

13	574A31	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM výkresy C.1.3 a C.1.4	M2	48,640	284,00	13 813,76
----	--------	--	----	--------	--------	-----------

CHODNÍKY - AB:
celková plocha: 48,64 = 48,640 [A]

14	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	48,640	391,00	19 018,24
----	--------	--	----	--------	--------	-----------

ACP 16 +
výkresy C.1.3 a C.1.4

CHODNÍKY - AB:
celková plocha: 48,64 = 48,640 [A]

5	Komunikace					41 707,83
---	------------	--	--	--	--	-----------

9	Ostatní konstrukce a práce					
---	----------------------------	--	--	--	--	--

15	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM neprováděné obrubníky: -130= - 130,000	M	-130,000	195,00	-25 350,00
----	--------	---	---	----------	--------	------------

9	Ostatní konstrukce a práce					-25 350,00
---	----------------------------	--	--	--	--	------------

Celkem:

28 613,96

Oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou

Rekapitulace

Kap. popis položky	Základ DPH
A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1 C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	-34 650,00
2 C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	0,00
3 Podružný materiál	0,00
4 Doprava z C21M a navázaného materiálu	0,00
5 Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného materiálu	0,00
6 C46M - Zemní práce (MONTÁŽ)	0,00
CELKEM URN	-34 650,00
B. HZS	
7 Hodinová zúčtovací sazba	0,00
CELKEM HZS	0,00
C. DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
CELKEM DODÁVKA	
D. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
8 GZS z C21M a navázaného materiálu	-866,25
9 GZS z C46M	0,00
CELKEM VRN	-866,25
REKAPITULACE CELKEM	-35 516,25
Náklady celkem [Kč] bez DPH:	-35 516,25
<u>Náklady celkem [Kč] vč DPH 21%:</u>	<u>-42 974,66</u>

Oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou

C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]
23.	21020-4011	montáž stožáru osvětlovacího ocel. bezpatic. do 12m	2 100,00	-11,00 ks	-23 100,00
28.	D21020-4011	demontáž stožáru osv. ocel. do 12m	1 050,00	-11,00 ks	-11 550,00
				celkem:	-34 650,00

Celkem za ceník:

Cena za ceník celkem:

-34 650,00 Kč

-34 650,00
