

ZMĚNOVÝ LIST Č. 22

Stavba: „Manětín – ČOV a kanalizace“

Číslo rozhodnutí o poskytnutí dotace (EIS): CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0006946

Objednatel: Město Manětín, Manětín 89, 331 62 Manětín, IČ: 00258091

TDI: AP INVESTING, s.r.o., Palackého tř. 12, 612 00 Brno. IČ: 60712121

Autorský dozor: VP Plzeň a.s., Pražská 14, 303 02 Plzeň, IČ: 62623508

Zhotovitel: Společnost Manětín – ČOV a kanalizace, PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 1, IČ: 43005560

Pojmenování změny: Provedení povrchové úpravy místní komunikace na stoce D6

Změna se týká těchto SO a PS: SO 11.6a - Stoka D6

Změnu navrhuje: zhotovitel

Odůvodnění a popis změny:

Předmětem změny je provedení povrchové úpravy stávající místní komunikace na stoce D6. Vzhledem k tomu, že stávající komunikace v úseku mezi šachtami ŠD6-6 až ŠD6-12 byla jen lehce zpevněná (dříve nejspíše pouze přístupová komunikace na zemědělské pozemky), došlo vlivem poježdění mechanizace při provádění stoky D6 k jejímu rozblácení a z tohoto důvodu se stala nesjízdnou pro osobní automobily. Protože v současnosti komunikace slouží jako obslužná pro několik nemovitostí podél stoky D6, bylo na žádost investora přistoupeno k-jejímu zpevnění štěrkem v celkové délce 155m a šířce 3,0m.

Změna je v souladu s ust. §222, odst. 4 zák.č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace: NE

Časový dopad na stavbu: NE

Výpočet nákladů na změnu: 47.616,00 Kč (bez DPH)

1/ Návrh změny vypracoval:

Jméno: Zdeněk Matys

Datum: 7. 4. 2021

Podpis

2/ Stanovisko autorského dozoru:☒☐**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Jan Vraný

Datum: 7. 4. 2021

Podpis

3/ Stanovisko TDI:☒☐**Doporučuji****Nedoporučuji**

Jméno: Ing. Petr Novák

Datum: 7. 4. 2021

Podpis

4/ Rozhodnutí objednatele o návrhu změny:☒☐**Odsouhlasuji****Zamítám**

Jméno: Mgr. Josef Gilbert Matuška

Datum: 7. 4. 2021

Podpis

Přílohy: 1) Situační schéma změny
2) Soupis a ocenění prací týkajících se změny
3) Fotodokumentace

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK - Změnový list č. 22

Projekt:	„Manžetín - ČOV a kanalizace“		
	Ev. číslo objednatele:		
	Ev. číslo zhotovitele:		
	Číslo akce objednatele:		


SO 11.6a - Stoka D6 (zpevnění komunikace)

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Změnový list č. 22

Kód dílu - Popis	Cena [CZK]				
	Dle SdP	Více práce	Méně práce	Rozdíl	Dle změnového listu
Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 5 - Komunikace pozemní	34 611,20	47 616,00	0,00	47 616,00	82 227,20
	34 611,20	47 616,00	0,00	47 616,00	82 227,20
	34 611,20	47 616,00	0,00	47 616,00	82 227,20

SOUPIS PRACÍ - Změnový list č. 22

př. Typ	kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Dle SdP	Více práce	Méně práce	Dle změnového listu	Více práce	Méně práce	Rozdíl	Dle změnového listu
Náklady soupisu celkem												
D	HSV	Práce a dodávky HSV				34 611,20	47 616,00	0,00	82 227,20			82 227,20
D	5	Komunikace pozemní				34 611,20	47 616,00	0,00	82 227,20			82 227,20
42	K	564821111 Podklad ze škvěrců 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 80 mm	m2	107,40	338,00	465,000	803,000		47 616,00		-47 616,00	82 227,20

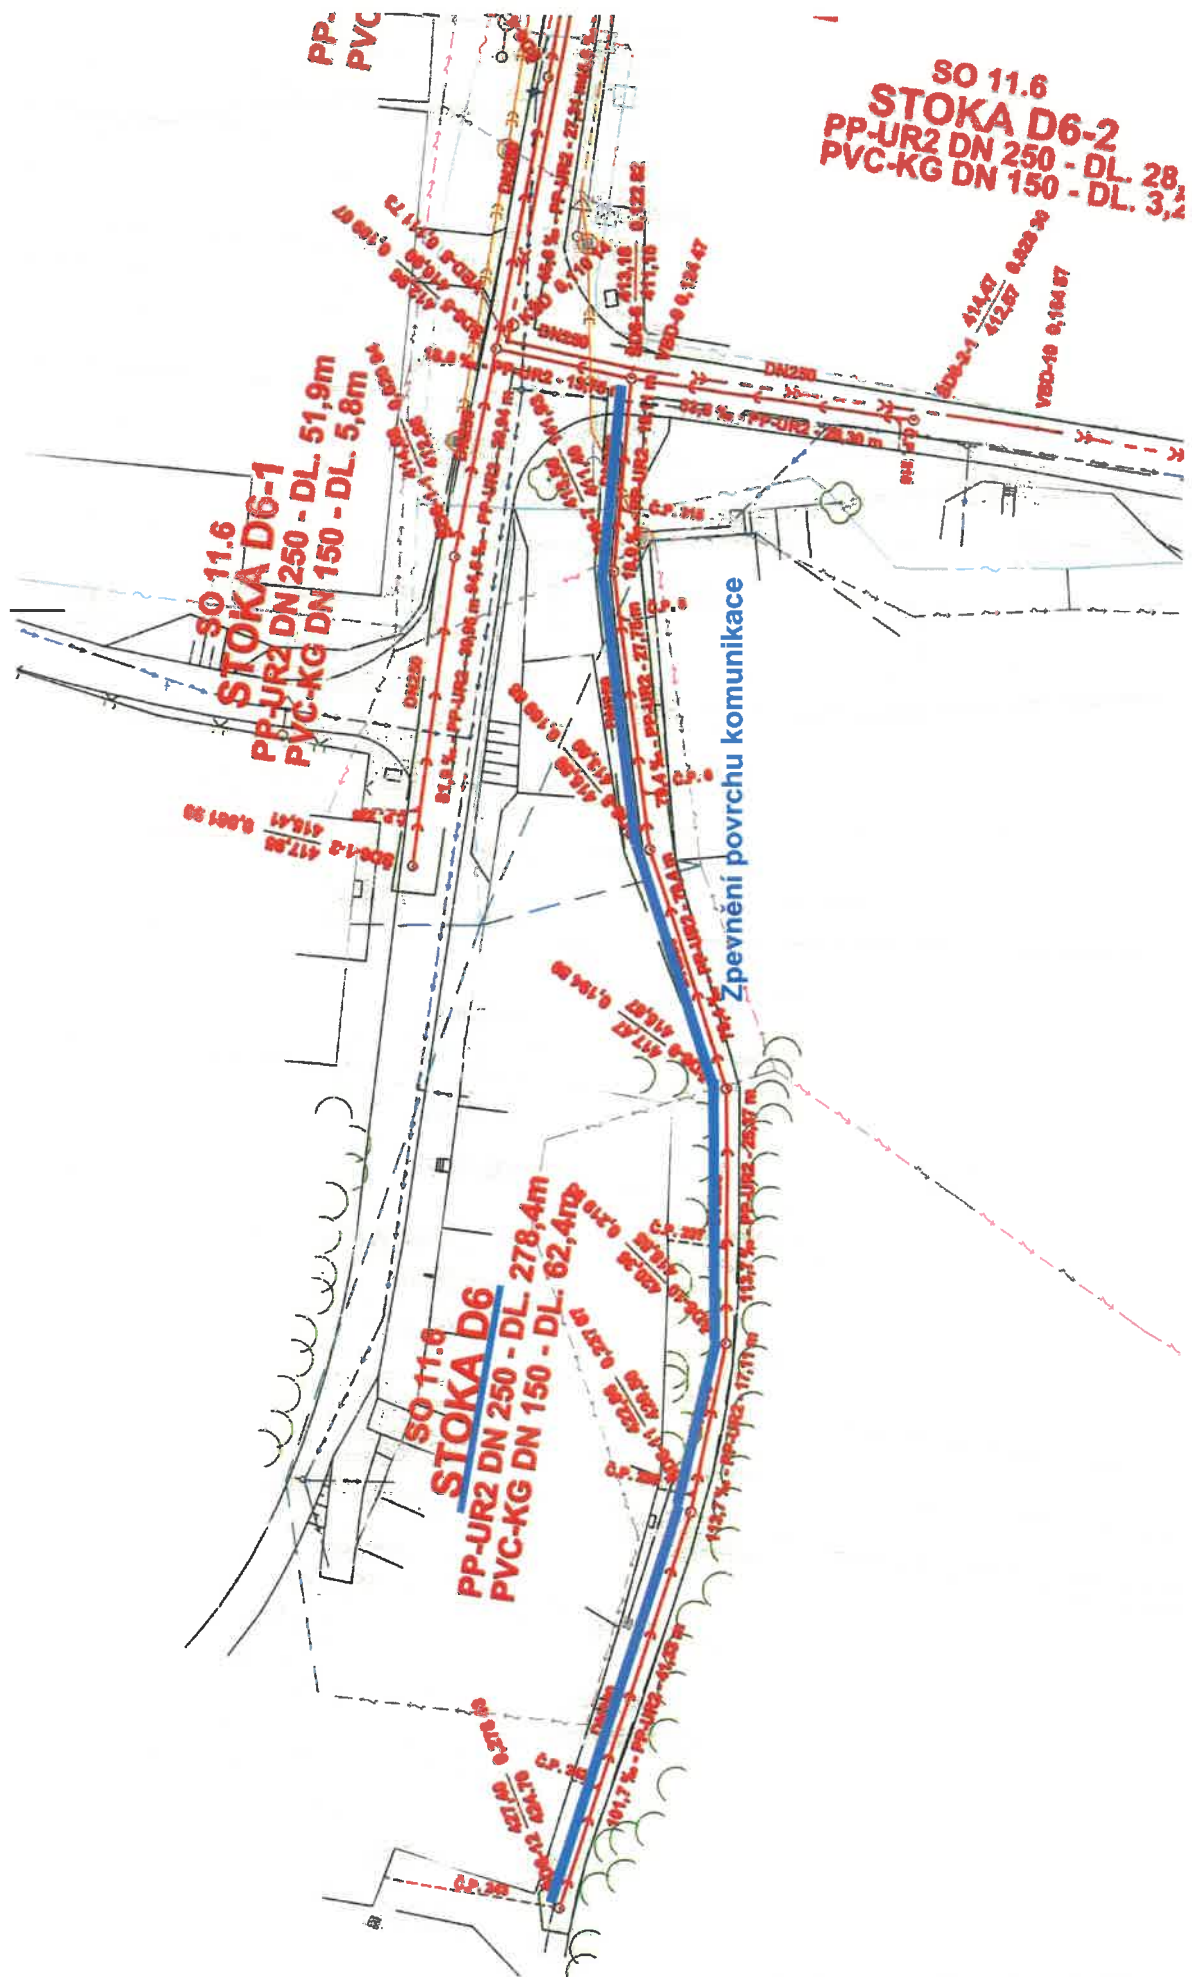

SO 11.6
STOKA D6-1
 PP-UR2 DN 250 - DL. 51,9m
 PVC-KG DN 150 - DL. 5,8m

SO 11.6
STOKA D6
 PP-UR2 DN 250 - DL. 278,4m
 PVC-KG DN 150 - DL. 62,4m

SO 11.6
STOKA D6-2
 PP-UR2 DN 250 - DL. 28,4m
 PVC-KG DN 150 - DL. 3,4m

Zpevnění povrchu komunikace

