

Smlouva o dílo č.: 841/TD/HC/2018/25

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Klenovice**
se sídlem: Klenovice 69, 392 01 Soběslav
zastoupený: Mgr. Lubomírem Turínem, starostou obce
IČ: 00512672
DIČ: CZ.....
Bankovní spojení: KB a.s., č.ú. 14725301/0100; 35-851651557/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Lubomír Turín, starosta obce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Mgr. Lubomír Turín
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zastoupený: Pavlem Závišem, vedoucím provozní jednotky na základě plné moci
Marií Vyskočilovou, ekonomkou provozní jednotky na základě plné moci
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 3505231/0100
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Pavel Záviš, Marie Vyskočilová
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Pavel Záviš, Josef Šabart
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl.4..

2.2 Dílem se rozumí:

Klenovice - Oprava místní komunikace p.č. 2419/1

2.3 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: 11.06.2018

Termín ukončení prací na komunikaci včetně asfaltových vrstev: do 10.08.2018

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: do 24.08.2018

3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostoje vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologiích jsou uvedeny v příslušných ČSN. .

dk

- 3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o minimálně shodný časový úsek. V případě posunutí termínu zahájení realizace díla nebo provádění technologii nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období z důvodů nezaviněných zhotovitelem, musí být mezi zhotovitelem a objednatelem adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie ..
- 3.5 Místo realizace díla: Klenovice

4. Cena díla

- 4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí: **1 956 445,- Kč**
(slovy: jeden milion devět set padesát šest tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

Cena bez DPH celkem	1 956 445,00 Kč
DPH 21%	410 853,00 Kč
Cena včetně DPH celkem	2 367 298,00 Kč

- 4.2 Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek, avšak nebude nižší než cena dle odst. 4.1.
- 4.3 Cena díla může být bez současné změny rozsahu díla změněna, pokud v průběhu realizace díla dojde k prokazatelnému nárůstu cen rozhodujících materiálů proti cenám zahrnutým v nabídce zhotovitele, a to o více jak 5%.
- 4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu neúplnosti či nedokonalosti projektové dokumentace, která je přílohou č. 3 k této smlouvě, anebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla (příp. dle odst. 4.3), anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA, a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

- 5.1 Provedené části díla (vč. případného plnění dle odst. 4.4 a/nebo dle odst. 8.5) budou zhotoviteli hrazeny na základě dílčích měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených vždy měsíčním soupisem provedených prací a dodávek.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 5.3 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku bez přenesení daňové povinnosti (tj. včetně daně z přidané hodnoty) dle § 92e a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Ve znění pozdějších předpisů. Sazba DPH je 21 %.

6. Stavební deník

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.
- 6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději do 25.7.2015. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele. V případě, že posunutí termínu předání staveniště objednatelům způsobí posun termínů provádění technologií nevhodných k realizaci v zimním počasí do zimního období, musí být mezi zhotovitelem a objednatelům adekvátně prodloužen termín dokončení a jakékoli dílčí termíny v závislosti na předpokládaný vliv počasí v zimním období na jednotlivé technologie.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.

8. Realizace díla

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař. č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).
- 8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelům. Po převzetí díla objednatelům přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodloužení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodloužení.

9. Provedení díla a přejímací řízení

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 5 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.
- 9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem anebo dnem zahájení silničního provozu (vždy od události, která nastane dříve). Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **48** měsíců. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:
- a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
 - c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění apod)., nebo
 - d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
 - e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
 - f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
 - g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s., provozní jednotka Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, 392 19 Soběslav, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálné technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady.

- 10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez daně z přidané hodnoty), a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1 Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. **Tento souhlas neplatí pro položkový rozpočet, jelikož jednotkové ceny považujeme za firemní tajemství.**
- 12.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.
- 12.3 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.


- 12.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 12.5 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.
- 12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

Smlouvu přezkoumal:



Smlouvu přezkoumal:

**Radka
Kratochvílová**




V Klenovicích dne 24.6. 2018

V Soběslavi dne

11-06-2018

Objednatel:


Mgr. Lubomír Turín
starosta obce

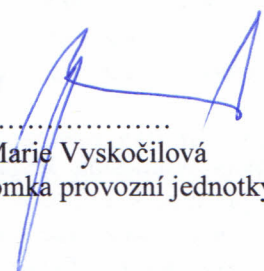


Zhotovitel:


Pavel Záviš
vedoucí provozní jednotky

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(38)


Marie Vyskočilová
ekonomka provozní jednotky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017-34

Stavba: Klenovice-oprava místní komunikace p.č.2419/1

KSO: 82227

Místo: Klenovice

Zadavatel:

Obec Klenovice, č.p.69, 39201 Klenovice

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 12. 2017

IČ:

00512672

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 956 445,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 956 445,00	410 853,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 367 298,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-34

Stavba: Klenovice-oprava místní komunikace p.č.2419/1

Místo: Klenovice

Datum: 28. 12. 2017

Zadavatel: Obec Klenovice, č.p.69, 39201 Klenovice

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 956 445,00	2 367 298,00	
101	Oprava MK p.č.2419/1	1 956 445,00	2 367 298,00	STA

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klenovice-oprava místní komunikace p.č.2419/1

Objekt:

101 - Oprava MK p.č.2419/1

Místo:

Klenovice

Datum: 28. 12. 2017

Zadavatel:

Obec Klenovice, č.p.69, 39201 Klenovice

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 956 445,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 920 895,00

1 - Zemní práce	303 039,90
4 - Vodorovné konstrukce	22 286,90
5 - Komunikace pozemní	1 300 497,30
8 - Trubní vedení	26 381,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	190 472,50
997 - Přesun sutě	48 094,40
998 - Přesun hmot	30 122,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	35 550,00
VRN3 - Zařízení staveniště	26 050,00
VRN9 - Ostatní náklady	9 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klenovice-oprava místní komunikace p.č.2419/1

Objekt:

101 - Oprava MK p.č.2419/1

Místo:

Klenovice

Datum: 28. 12. 2017

Zadavatel:

Obec Klenovice, č.p.69, 39201 Klenovice

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

1 956 445,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 920 895,00

D 1

Zemní práce

303 039,90

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	38,000	59,20	2 249,60	CS ÚRS 2017 02
	VV		"odstranění betonového žlabu z prefabrikátů v km 0,128-0,165 P" 38		38,000			
2	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těžného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	192,000	31,70	6 086,40	CS ÚRS 2017 02
	VV		"odstranění povrchu stávajících vjezdů"					
	VV		"vlevo" 9+35+16+12+9		81,000			
	VV		"vpravo" 32+11+10+6+19+12+10+11		111,000			
	VV		Součet		192,000			
3	K	113107130	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	137,500	187,30	25 753,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		"odstranění povrchu stávajících vjezdů"					
	VV		"vlevo" 44,5+9+8+10+16+6		93,500			
	VV		"vpravo" 2+19+6+3+7+7		44,000			
	VV		Součet		137,500			
4	K	113107141	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živiných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	44,000	47,20	2 076,80	CS ÚRS 2017 02
	VV		"odstranění povrchu stávajících vjezdů"					
	VV		"vlevo" 9+35		44,000			

Kód			Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	1 663,000	108,60	180 601,80	CS ÚRS 2017 02
6	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	37,500	231,40	8 677,50	CS ÚRS 2017 02
VV					"výkop pro doplnění vozovky na jejím okraji" 250*0,3*0,5		37,500	
7	K	132301102	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 m3	m3	92,550	464,60	42 998,70	CS ÚRS 2017 02
VV					"výkop pro doplnění vozovky na jejím okraji" 617*0,3*0,5		92,550	
8	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	18,510	26,70	494,20	CS ÚRS 2017 02
VV					"20% z položky" 92,55*0,2		18,510	
9	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	92,550	59,40	5 497,50	CS ÚRS 2017 02
VV					"přebytek z výkopů na skládku" 92,55		92,550	
10	K	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 663,000	17,20	28 603,60	CS ÚRS 2017 02
VV					"úprava podkladu pod nový kryt" 1663		1 663,000	
D 4 Vodorovné konstrukce							22 286,90	
11	K	451504111	Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	38,760	51,30	1 988,40	CS ÚRS 2017 02
VV					"výměna betonového žlabu z prefabrikátů v km 0,128-0,165 P" 38*1,02		38,760	
12	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	4,788	319,70	1 530,70	CS ÚRS 2017 02
VV					"výměna betonového žlabu z prefabrikátů v km 0,128-0,165 P" (38*0,6*0,1)*2,1		4,788	
13	K	452112111	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm	kus	4,000	306,30	1 225,20	CS ÚRS 2017 02
14	M	592238760	rám zabetonovaný pro uliční vpusti 500/500 mm	kus	4,000	1 985,00	7 940,00	CS ÚRS 2017 02
15	K	465921215	Kladení dlažby z betonových nebo železobetonových desek a tvárnic na sucho na plochách vodorovných nebo ve sklonu hmotnosti do 60 kg se zalitím spár cementovou maltou MCs tl. do 100 mm	m2	38,000	186,40	7 083,20	CS ÚRS 2017 02
VV					"výměna betonového žlabu z prefabrikátů v km 0,128-0,165 P" 38		38,000	
16	M	592274960	žlabovka betonová příkopová přírodní 33x59x8 cm	kus	38,760	65,00	2 519,40	CS ÚRS 2017 02
VV					"výměna betonového žlabu z prefabrikátů v km 0,128-0,165 P" 38*1,02		38,760	
D 5 Komunikace pozemní							1 300 497,30	
17	K	564761111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	308,500	175,90	54 265,20	CS ÚRS 2017 02
VV					"doplnění podkladu na okrajích vozovky" 617*0,5		308,500	
18	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	373,500	86,70	32 382,50	CS ÚRS 2017 02
VV					"vyrovnaní podkladu ve vjezdech"			
VV					"vlevo" 81+93,5+44		218,500	
VV					"vpravo" 111+44		155,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			373,500			
19	K	564861111	Podklad ze štěrkdrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	308,500	165,30	50 995,10	CS ÚRS 2017 02
VV		"doplnění podkladu na okrajích vozovky" 617*0,5			308,500			
20	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 663,000	204,70	340 416,10	CS ÚRS 2017 02
21	K	566201111	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2	m2	1 663,000	43,20	71 841,60	CS ÚRS 2017 02
22	K	569811111	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkdrti tl. 50 mm	m2	308,500	57,30	17 677,10	CS ÚRS 2017 02
VV		617*0,5			308,500			
23	K	572131111	Vyrovnaní povrchu dosavadních krytů s rozprostřením hmot a zhutněním živичnou směsí pro asfaltový koberec otevřený AKO tl. od 20 do 40 mm	m2	332,600	123,40	41 042,80	CS ÚRS 2017 01
VV		"20% z celkové plochy" 1663*0,2			332,600			
24	K	573211111	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	1 663,000	20,50	34 091,50	CS ÚRS 2017 02
25	K	573312111	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem, v množství 3,00 kg/m2	m2	1 663,000	64,50	107 263,50	CS ÚRS 2017 02
26	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	1 663,000	215,60	358 542,80	CS ÚRS 2017 02
27	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	373,500	243,70	91 022,00	CS ÚRS 2017 02
VV		"vjezdy k nemovitostem"						
VV		"vlevo" 81+93,5+44			218,500			
VV		"vpravo" 111+44			155,000			
VV		Součet			373,500			
28	M	592453110	dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	380,970	265,00	100 957,10	CS ÚRS 2017 02
D 8		Trubní vedení					26 381,60	
29	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	1 542,80	6 171,20	CS ÚRS 2017 02
30	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	4,000	1 476,20	5 904,80	CS ÚRS 2017 02
31	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	16,000	894,10	14 305,60	CS ÚRS 2017 02
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					190 472,50	
32	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	453,000	241,60	109 444,80	CS ÚRS 2017 02
VV		"ohraničení dlažby vjezdů"						

Kód		Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		"vlevo" 2*(2*9+2*5+3*2+6+2*3+3*2,5+3,5+4,5)+(15*4)*2		243,000			
VV		"vpravo" 2*(7*1,5+5*2+3*3,5)+(15*4)*2+14*2		210,000			
VV		Součet		453,000			
33	M	592174110 obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný 100x8x20 cm	kus	462,060	92,50	42 740,60	CS ÚRS 2017 02
34	K	919122111 Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živiniém krytu včetně adhezniho nátěru s těsnicím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm	m	25,900	125,00	3 237,50	CS ÚRS 2017 02
VV		5,4+11,5+6+3		25,900			
35	K	919732221 Styčná pracovní spára při napojení nového živiniého povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry	m	25,900	87,40	2 263,70	CS ÚRS 2017 02
VV		5,4+11,5+6+3		25,900			
36	K	919735112 Řezání stávajícího živiniého krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	25,900	86,30	2 235,20	CS ÚRS 2017 02
VV		5,4+11,5+6+3		25,900			
37	K	938909611 Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	308,500	34,20	10 550,70	CS ÚRS 2017 02
VV		617*0,5		308,500			
38	K	Nab -1 Přeložky a ochrana podzemních sítí	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	
VV		"přeložení a zajištění ochrany podzemních vedení - odhad" 1		1,000			
D	997	Přesun sutě				48 094,40	
39	K	997221551 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	486,293	63,40	30 831,00	CS ÚRS 2017 02
40	K	997221569 Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 431,465	7,10	17 263,40	CS ÚRS 2017 02
VV		486,293*5 'Přepočtené koeficientem množství		2 431,465			
D	998	Přesun hmot				30 122,40	
41	K	998225111 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiniým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	333,951	90,20	30 122,40	CS ÚRS 2017 02
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				35 550,00	
D	VRN3	Zařízení staveniště				26 050,00	
42	K	032903000 Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	7 550,00	7 550,00	CS ÚRS 2017 02
43	K	034303000 Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	CS ÚRS 2017 02
VV		"přechodné dopravní značení a zpracování DIO" 1		1,000			
D	VRN9	Ostatní náklady				9 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	K	091003000	Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2017 02
	vv		"vytýčení podzemních sítí" 1		1,000			

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017-34

Stavba: Klenovice-oprava místní komunikace p.č.2419/1

Místo: Klenovice

Datum: 28. 12. 2017

Zadavatel: Obec Klenovice, č.p.69, 39201 Klenovice

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 956 445,00	2 367 298,00	
101	Oprava MK p.č.2419/1	1 956 445,00	2 367 298,00	STA
