

Smlouva o dílo (dále SOD)

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

se sídlem: Obec Ejpovice
zastoupený: Hlavní 24, 337 01 Ejpovice
Jaromírem Kalčíkem, starostou
IČ: 00258695
DIČ: CZ 00258695
Bankovní spojení: 4728381/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Rokycany

I.2. Zhotovitel :

Se sídlem : BIGGEST construct s.r.o.
zastoupený : Filipem Brudnou, jednatelem
IČ : 05278627
DIČ: CZ05278627
Bankovní spojení ČSOB a.s., č.ú. 275258297/0300
tel.: 724 365 983
e-mail: nfo@biggest.cz

I.3. Vedlejší účastník smlouvy:

Obec Kyšice
se sídlem: Horní Náves 136, 330 01 Kyšice
zastoupený: Mgr. Martinou Beranovou, starostkou
IČ: 00258024
DIČ: CZ00258024
Bankovní spojení: 1003039300/5500, Raiffeisenbank a.s.

(dále jen smluvní strany)

II. Předmět díla

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „**Oprava cyklostezky Ejpovice Kyšice**“.

Dodávka stavebních prací bude zabezpečena v souladu s obecně platnými technickými požadavky na výstavbu a dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou smlouvy o dílo.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla.

Místem plnění předmětu díla je k.ú. obce Ejpovice (pozemky nebo části pozemků objednatele p.č.: 261/21, 261/44, 261/57, 261/25, 261/55, 261/38, 261/2, 261/53, 261/40 a 261/37) a k.ú. obce Kyšice (pozemky nebo části pozemků vedlejšího účastníka 747/1, 717/5, 747/2, 717/4, 717/8, 717/9 a 717/3).

II.2. Použité materiály jsou stanoveny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému nabídkovému rozpočtu. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156, zák. č. 183/2006 Sb., v platném znění.

II.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II.4. Předmětem díla je také všechno to, co bylo součástí výzvy a podkladů pro vypracování nabídky (příloha smlouvy č.1 ze dne 20.8.2020 - vypsání výběrové řízení na dodavatele projektu „**Oprava cyklostezky Ejpovice Kyšice**“).

II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je dohodnuta ve výši :

Ejpovice

Cena bez DPH:	2.752.331,00 Kč
DPH 21 %:	577.989,51 Kč
Cena včetně DPH:	3.330.320,51 Kč

Kyšice

Cena bez DPH:	1.408.905,00 Kč
DPH 21 %:	295.870,05 Kč
Cena včetně DPH:	1.704.775,05 Kč

CELKEM

Cena bez DPH:	4.161.236,00 Kč
DPH 21 %:	873.859,56 Kč
Cena včetně DPH:	5.035.095,56 Kč

V souladu s Obchodními podmínkami ze zadávací dokumentace je cena stanovena jako nejvýše přípustná.

III.2. Položkový rozpočet jsou nedílnou součástí SOD (dodatek č. 2). Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu díla dle čl. II.1.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na vyhotovení geometrického plánu stavby, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení. V průběhu realizace stavby bude objednatel plátcem DPH.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání staveniště: min. 5 dnů před dohodnutým termínem zahájení prací na díle

IV.2. Zahájení prací na díle: 1.3.2021

IV.3. Dokončení prací na díle: nejpozději do 30.4.2021 (dodatek č.3 Harmonogram).

IV.4. Vyklopení staveniště: do 7 dnů od dokončení díla

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 3 dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele je objednatel povinen nejpozději do 5ti pracovních dnů od data doručení se vyjádřit, a to i včetně stanoviska vedlejšího účastníka smlouvy. Následně vystaví zhotovitel daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je min. 21 kalendářních dnů od data doručení objednateli.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

V.3. Zhotovitel nepožaduje zálohu

V.4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10% ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a předání všech dokladů nutných k vydání kolaudačního souhlasu příslušného stavebního úřadu.

V.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění zjištěných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to 3.000,- Kč za každý den prodlení.

VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV.4. smlouvy, a to 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

VI.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 5 dnů před dohodnutým termínem zahájení prací.

VII.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

VII.3. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vytýčení všech podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení a majetku objednatele vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady napojení na odběrná místa energií včetně podružného měření odběrů.

VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VII.10. Nejpozději do 7 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI.1.3. a to až do vyklizení staveniště.

VII.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VIII.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen zjednat neprodleně nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

VIII.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 1.000.000,- Kč. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VIII.12. Pokud činnostmi zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

VIII.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

VIII.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII.16. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit neprodleně – nejpozději do 3 dnů - podrobný technologický postup provádění i dílčích prací. V případě, že tak neučiní, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

IX.2. Ve stavební deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, sídlo, IČ zhotovitele
název, sídlo, IČ objednatele
název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí stavbyvedoucí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 5ti pracovních dnů ode dne, kdy je se zápisem prokazatelně seznámen.

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Uvedený zápis nenahrazuje dodatek smlouvy.

IX.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to nejméně 5 dnů přede dnem předání. Objednatel je povinen v určeném termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

X.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

X.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 132/1998 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

X.5. Dílo je považováno za ukončené podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

X.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

X.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 3 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. ZÁRUKY

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 36 měsíců mimo dodávek materiálu, strojů a zařízení, u kterých stanovuje výrobce kratší záruční lhůtu, min. však 24 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn požadovat :

XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.)

XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XI.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XI.4.4. Odstoupení od smlouvy.

XI.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

XI.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však v termínu, který určí objednatel. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém, nebo objednatelům určeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XI.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XII. VYŠŠÍ MOC

XII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstoupí. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstoupí a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení další strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílní konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílnímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílní přejímací řízení.“ Po dílním předání a převzetí provedených prací sjednají smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XIII.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XIV.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem,
- zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na dobu delší než 15 dnů. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje:
- objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti.

XIV.2. V případě podstatného porušení smlouvy je oprávněná strana povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

XIV.3. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit také v případě, že objednatel nezajistí komplexní financování díla ve lhůtě 1 roku od podpisu smlouvy. V takovém případě nebude zhotovitel uplatňovat na objednateli žádný nárok na úhradu jakékoliv škody.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XV.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem smlouvy potvrzen podpisem oprávněných osob všech smluvních stran. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem.

XV.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude 1x měsíčně zabezpečen přístup k ČOV pro vývoz kalu a že zajistí také přístup do kempu.

XV.3. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XV.4. Strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XV.5. Tato SOD je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

XV.6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

XVI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- č.1 - vypsání výběrové řízení na dodavatele projektu „**Oprava cyklostezky Ejpovice Kyšice**“). ze dne 20.8.2020
- č.2 - nabídkový rozpočet stavby zpracovaný zhotovitelem
- č.3 - harmonogram

V Ejpovicích dne 13.1.2021

za objednatele:



za zhotovitele:
Filip Brudna, jednatel

BIGGEST ①

BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a, Skvrňany, 301 00 Plzeň
IČ: 052 78 627 DIČ: CZ05278627

vedlejší účastník smlouvy

OBEC KYŠICE
okres Plzeň - město

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.

Obec Ejpovice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany obce veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení (zastupitelstvo obce - usnesení č. 106/2020, ze dne 21.12.2020, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

Obec : EJPOVICE
Se sídlem : Hlavní 24, 337 01 Ejpovice
IČ : 00258695

Výběrové řízení na dodavatele projektu s názvem

„OPRAVA CYKLOSTEZKY EJPOVICE KYŠICE“

Cíl projektu: Oprava povrchu stávající cyklostezky k zajištění bezpečného provozu po cyklostezce.

Výběrové řízení (dále jen VŘ) na realizaci díla: „OPRAVA CYKLOSTEZKY EJPOVICE KYŠICE“

Předmětem poptávky je dodávka opravy povrchu stávající cyklostezky k zajištění bezpečného provozu po cyklostezce podle přiloženého situačního nákresu a rozpisu požadovaných oprav po úsecích.

Místo realizace : k.ú.obce Ejpovice a k.ú.obce Kyšice

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Jaromír Kalčík - starosta, tel.+420 737 200 989, E-mail: starosta@ejpovice.cz


Mgr. Martina Beranová – starostka, tel.+420 725 041 042, E-mail: obec@kysice.eu

Termíny:

Nabídky posílejte v elektronické podobě na adresu: obec@ejpovice.cz do 31.8.2020.

Předpokládaný termín realizace: předání dokončení díla **nejpozději do 30.06.2021.**

Specifikace předmětu VŘ:

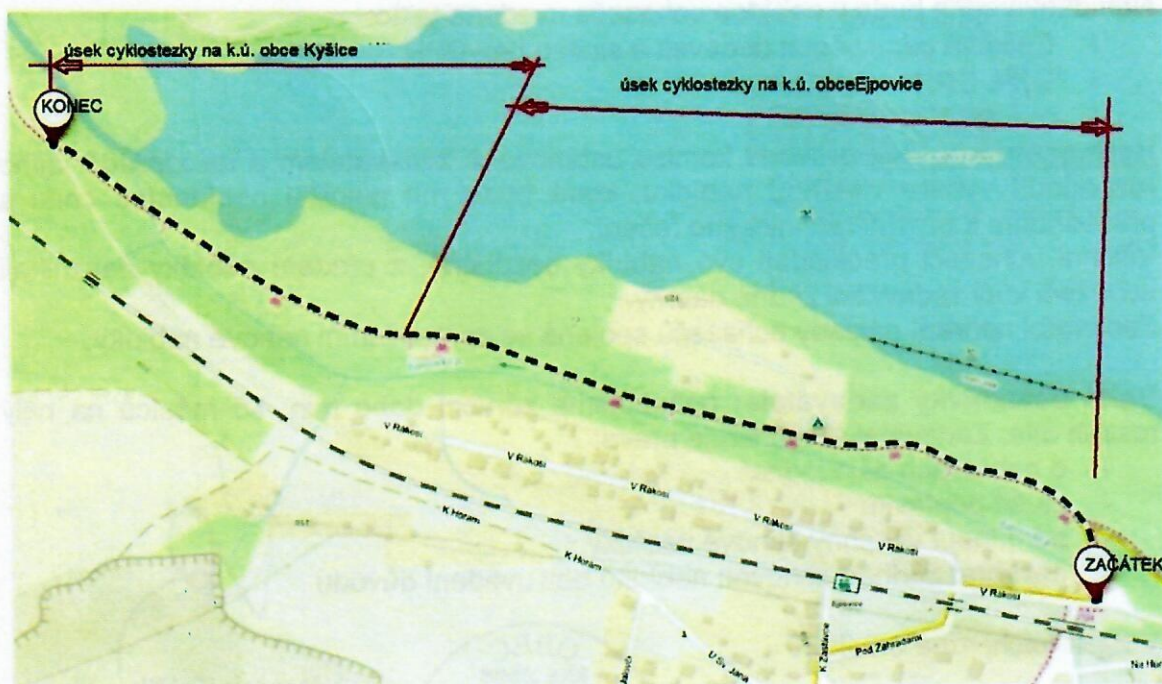

Požadavek provedených oprav cyklostezky Ejpovice Kyšice

Komunikace k ČOV od začátku opravy přes kemp (katastr Ejpovice)- úpravou nedojde ke zvýšení nivelety cyklostezky

Úprava pláň se zhuštěním
Vrstva ŠD tl. 20cm
Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm
Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m ²
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š 3 m
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š 3 m
Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm včetně napojení sjezdů a parkoviště u kempu
Terénní úpravy -rozprostření ornice vč. zasetí trávy

Komunikace od ČOV přes mostek k napojení na stávající asfaltovou cyklostezku (katastr Kyšice)- úpravou nedojde ke zvýšení nivelety cyklostezky

Úprava pláň se zhuštěním
Vrstva ŠD tl. 20cm
Vrstva ŠD tl. 20cm
Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm
Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m ²
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š 3 m
Asfaltový beton vrstva ohranovávací ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š 3 m z nemodifikovaného asfaltu
Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm, včetně napojení sjezdů
Upravit průjezd na mostku přes Ejpovický potok – max. šíře 1,50 m, osadit betonové zábradlí (svodidla)
Terénní úpravy -rozprostření ornice vč. zasetí trávy

Součástí nabídky bude:

Alespoň jedna referenční akce: realizace opravy nebo stavby cyklostezky srovnatelného objemu s uvedením jména objednatele a telefonní kontakt na jeho zástupce.

Technický popis provedení opravy, vč. detailního popisu a položkového rozpočtu, který bude rozdělen podle prováděných prací na kat.území obce Ejpovice a Kyšice.

Návrh SoD s uvedením nabídkové ceny.

Nabídková cena bude neměnná po celou dobu realizace, musí zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací díla.

Nabídková cena bude v nabídce uchazeče uvedena takto:

- Celková cena všech dodávek a služeb bez DPH
- Výše DPH

Hodnocení nabídek provede komise ustanovená zadavatelem a na základě jejího rozhodnutí vybere vítěznou nabídku, která bude mít nejnížší nabídnutou cenu s přihlédnutím k návrhu technického řešení.

Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně, z předání nabídky nevznikají uchazeči vůči zadavateli žádné nároky.

Zadavatel nehradí náklady uchazečů spojené se zpracováním cenové nabídky.

Další požadavky zadavatele: požadujeme záruční dobu min. 36 měsíců na celý rozsah díla. Zadavatel si vyhrazuje právo:

- o nabídkách dále jednat
- zrušit poptávku
- odmítnout všechny cenové nabídky
- nevybrat žádnou cenovou nabídku bez uvedení důvodu

V Ejpovicích, dne 3.8.2020



Jaromír Kalčík
starosta

BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a, Skvrňany, 301 00 Plzeň
IČ: 052 78 627 DIČ: CZ05278627

ROZPOČET

Stavba: Ejpovice - oprava cyklostezky - od ČOV (k.ú. Kyšice)

Objekt: Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 408 905,00

1

Zemní práce

120 030,00

1	221		Odkopávky hor. 1-4	m3	90,000	105,00			9 450,00	
2	221		Úprava pláň se zhutněním	m2	160,000	18,00			2 880,00	
3	221		Vodorovné přemístění výkopku do 1000m	m3	90,000	35,00			3 150,00	
4	221		Vodorovné přemístění do 10000m	m3	90,000	235,00			21 150,00	
5	221		Příplatek zkd 1000m	m3	900,000	15,00			13 500,00	
6	221		Skládkovné - výkopek	t	180,000	195,00			35 100,00	
7	221		Rozprostření ornice vč. zasetí trávy	m2	600,000	58,00			34 800,00	

5

Komunikace

1 288 875,00

8	221	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	1 220,000	59,00			71 980,00	
9	221		Vrstva ŠD tl. 20cm	m2	1 220,000	195,00			237 900,00	
10	221		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š 3 m	m2	1 220,000	313,00			381 860,00	
11	221	569931131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm	m2	400,000	115,00			46 000,00	
12	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	1 220,000	42,00			51 240,00	
13	221	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 220,000	386,00			470 920,00	
14	221		Přesun hmot	t	305,000	95,00			28 975,00	

Celkem

1 408 905,00

ROZPOČET

Stavba: Ejpovice - oprava cyklostezky k ČOV (k.ú. Ejpovice)

Objekt: Komunikace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemní práce

548 671,00

1	221		Frézování asfaltového povrchu v tl. 50mm - napojení komunikací	m2	188,000	188,00			35 344,00	
2	221		Odstranění asfalt. krytu v tl. do 80mm	m2	330,000	93,00			30 690,00	
3	221		Odkopávky hor. 1-4	m3	185,000	105,00			19 425,00	
4	221		Úprava pláň se zhutněním	m2	490,000	18,00			8 820,00	
5	221		Vodorovné přemístění výkopku do 1000m	m3	185,000	35,00			6 475,00	
6	221		Vodorovné přemístění do 10000m	m3	185,000	235,00			43 475,00	
7	221		Příplatek zkd 1000m	m3	1 850,000	15,00			27 750,00	
8	221		Skládkovné - výkopek	t	370,000	195,00			72 150,00	
9	221		Odvoz vybourané suti do 1km	t	301,000	187,00			56 287,00	
10	221		Příplatek zkd 1000m	t	4 515,000	18,00			81 270,00	
11	221		Skládkovné - vybouraná suť	t	301,000	285,00			85 785,00	
12	221		Rozprostření ornice vč. zasetí trávy	m2	1 400,000	58,00			81 200,00	

5

Komunikace

2 203 660,00

13	221	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	2 080,000	59,00			122 720,00	
14	221		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š 3 m	m2	2 080,000	510,00			1 060 800,00	
15	221	569931131	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 90 mm	m2	700,000	115,00			80 500,00	
16	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	2 080,000	42,00			87 360,00	
17	221	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 080,000	386,00			802 880,00	
18	221		Přesun hmot	t	520,000	95,00			49 400,00	

Celkem

2 752 331,00

HARMONOGRAM

BIGGEST

Název akce: Oprava cyklostezky Ejpovice Kyšice

Předpokládaný termín realizace: 1.3. - 30.4.2021

	2021									
	březen					duben				
týden	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
Zemní práce k ČOV										
Zemní práce od ČOV										
Podkladní vrstvy, asfaltové vrstvy										

V Plzni 12.10.2020

BIGGEST

BIGGEST construct s.r.o.
Borská 1232/40a, Skvrňany, 301 00 Plzeň
IČ: 052 78 627 DIČ: CZ05278627

① 

PRÍLOHA č. 3
